VISOFLEX
o futuro começa agora

Desenho de Aprovação Portas Rápidas VFX101 Insulada

Especificações

1. Data:
2. Proposta Aprovada:
3. Cliente:
4. Representante :
5. Setor da instalação
6. QTD
7. Largura do vão (em mm)
8. Altura do vão (em mm)

9. Lado do motor (indicar quantidade)
- ☐ Direito (como no desenho):
- ☐ Esquerdo:

10. Voltagem
- ☐ 220V/1 fase/60Hz
- ☐ *220V/3 fases/60Hz
- ☐ *380V/3 fases/60Hz
- ☐ *440V/3 fases/60Hz

11. Ferragens
- ☐ Pintura eletrostática **Branco** Munsell N9,5
- ☐ Pintura eletrostática **Cinza** Munsell N6,5
- ☐ *Inox 304 (exceto eixo)

12. Visor
- ☐ Sem Visor
- ☐ *Com Visor

*** Itens opcionais (Verificar processo comercial)**

13. Quadro de comando
- ☐ Aço Carbono Pintado
- ☐ *Aço inox 304 Pintado
- ☐ *PSAI (Plástico Industrial)

14. Cor do PVC
- ☐ Azul
- ☐ Branco
- ☐ Cinza
- ☐ *Outra sob consulta (indicar Obs)

15. Intertravamento
- ☐ Não
- ☐ *Sinal para cortina de ar
- ☐ *Sinal para porta aberta/fechada
- ☐ *Sinal de Intertravamento entre portas Visoflex

16. Tampa de motor
- ☐ Não
- ☐ *Sim

17. Opcionais totais, para todas as portas (indicar QTD ao lado)
- ☐ *Botoeira Extra;
- ☐ *Looping;
- ☐ *Radar;
- ☐ *Pingente (sem braço);
- ☐ *Braço Ping. aço pint.;
- ☐ *Braço Ping. aço inox;
- ☐ *CJ Remoto 433Mhz;
- ☐ *Receptor Digimote;
- ☐ *Transmissor Digimote;
- ☐ *Sonalarme;
- ☐ *Botoeira Touchless;
- ☐ *Barra de LED;
- ☐ *Display Gráf. (tempo);

18. Temperatura Interna
- ☐ 0ºC a 15ºC (sem gelo)
- ☐ +16ºC a 50ºC

19. Temperatura Externa
- ☐ 0ºC a 15ºC (sem gelo)
- ☐ +16ºC a 50ºC

20. Pressão do local (direcionada)
- ☐ Sem pressão
- ☐ Baixa: Até 20Km/h
- ☐ Média: De 20Km/h a 40Km/h (vide limite em função da largura do vão)

21. Espaços e pontos de fixação necessário verificados no desenho
- ☐ Sim
- ☐ Não

22. Medições realizadas por
- ☐ Visoflex
- ☐ Cliente/Projeto Cliente

23. Observações

Medidas Necessárias

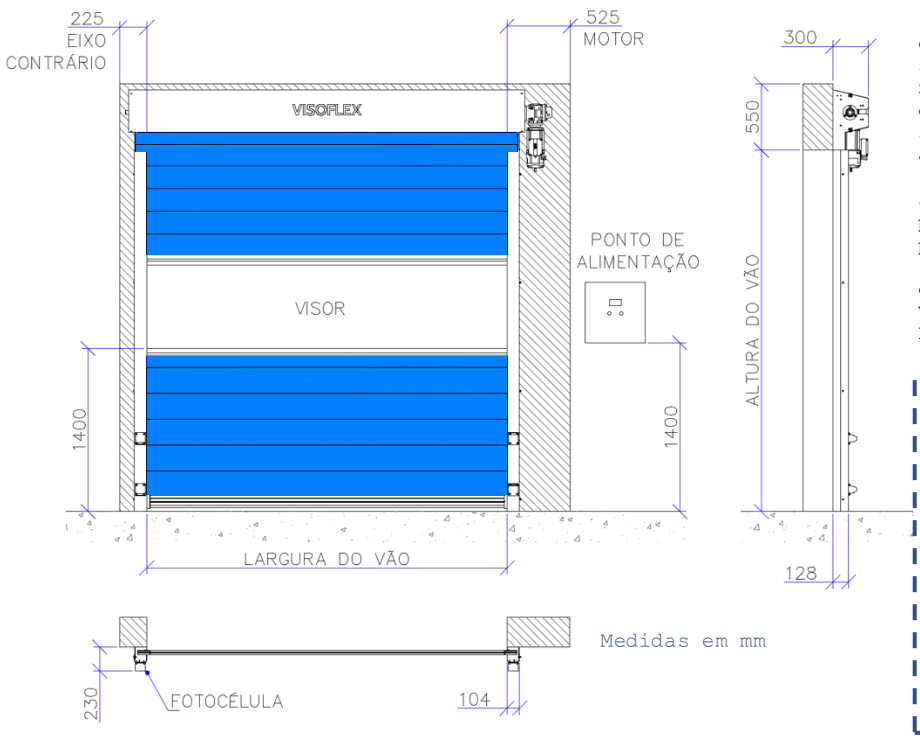

IMPORTANTE: (01) Verificar a existência de tubulações ou obstáculos que possam interferir na instalação (área indicada no desenho). (02) É de responsabilidade do cliente providenciar que o local da instalação tenha resistência mecânica adequada a suportar o peso e funcionamento da porta. (03) As superfícies de apoio e piso devem ser planas, rígidas e niveladas. (04) Porta projetada para fluxo de empilhadeiras. (05) Este desenho deve seguir as especificações e opções da proposta Visoflex aceita comercialmente.
Revisão 12 de 19/01/2026

APROVAÇÃO

Nome:_____

Setor:_____

Data:_____

Assinatura:

_____
