VISOFLEX
o futuro começa agora

Desenho de Aprovação Portas Rápidas VFX601 Freezer

Especificações

1. Data:

2. Proposta Aprovada:

3. Cliente:

4. Representante :

5. Setor da instalação:

6. QTD:

7. Largura do vão (em mm)

8. Altura do vão (em mm)

9. Lado do motor (indicar quantidade)
- ☐ Direito (como no desenho):
- ☐ Esquerdo:

10. Voltagem
- ☐ 220V/1 fase/60Hz
- ☐ *220V/3 fases/60Hz
- ☐ *380V/3 fases/60Hz
- ☐ *440V/3 fases/60Hz

11. Ferragens (para todas opções colunas em alumínio com pintura eletrostática branca)
- ☐ Pintura eletrostática **Branco** Munsell N9,5
- ☐ Pintura eletrostática **Cinza** Munsell N6,5
- ☐ *Inox 304 (exceto eixo).

12. Quadro de comando
- ☐ Aço Carbono Pintado
- ☐ PSAI (Plástico Industrial)
- ☐ *Aço inox 304 Pintado

13. Cor do PVC
- ☐ Azul
- ☐ Branco
- ☐ Cinza
- ☐ * Outra sob consulta (indicar Obs)

14. Intertravamento
- ☐ Não
- ☐ *Sinal para cortina de ar
- ☐ *Sinal para porta aberta/fechada
- ☐ *Sinal de Intertravamento entre portas Visoflex

15. Tampa de motor
- ☐ Não
- ☐ *Sim

16. Opcionais totais, para todas as portas (indicar QTD ao lado)
- ☐ *Botoeira Extra;
- ☐ *Looping;
- ☐ *Radar;
- ☐ *Pingente (sem braço);
- ☐ *Braço Ping. aço pint.;
- ☐ *Braço Ping. aço inox;
- ☐ *CJ Remoto 433Mhz;
- ☐ *Receptor Digimote;
- ☐ *Transmissor Digimote;
- ☐ *Sonalarme;
- ☐ *Botoeira Touchless;
- ☐ *Barra de LED;
- ☐ *Display Gráf. (tempo);
- ☐ *Resistência de piso.
- ☐ *Preparação de motor < -20ºC
- ☐ *Resistência de quadro de comando

17. Temperatura Interna
- ☐ -30ºC a -21ºC
- ☐ -20ºC a -1ºC
- ☐ 0ºC a 15ºC (sem gelo)
- ☐ +16ºC a 50ºC

18. Temperatura Externa
- ☐ -30ºC a -21ºC
- ☐ -20ºC a -1ºC
- ☐ 0ºC a 15ºC (sem gelo)
- ☐ +16ºC a 50ºC

19. Posição de montagem da porta
- ☐ Interna
- ☐ Externa

20. Pressão do local (direcionada)
- ☐ Sem pressão
- ☐ Antecâmara ou Câmara, baixa: Até 20Km/h
- ☐ Túnel de congelamento alta: De 20Km/h a 60Km/h

21. Espaços e pontos de fixação necessário verificados no desenho
- ☐ Sim
- ☐ Não

22. Medições realizadas por
- ☐ Visoflex
- ☐ Cliente/Projeto Cliente

23. Observações

*** Itens opcionais (Verificar processo comercial)**

Medidas Necessárias

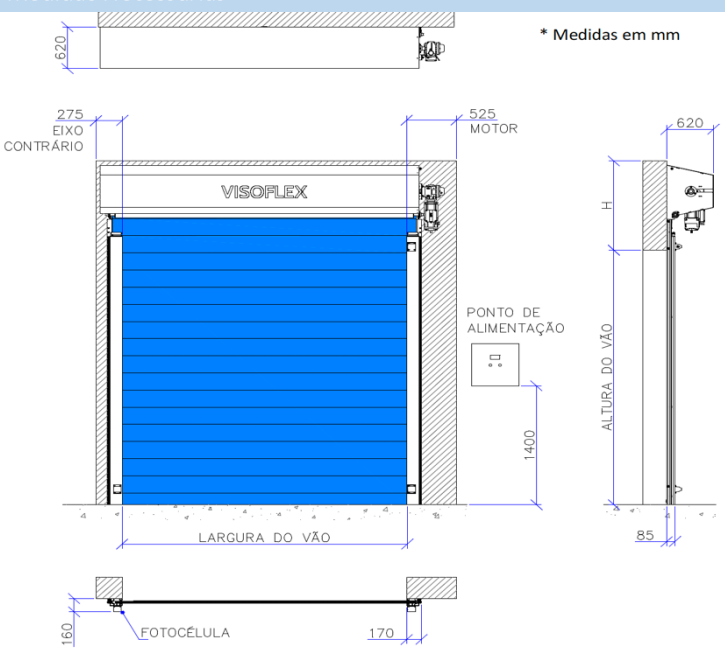

NOTA:
H=1050mm, SE ALTURA DO VÃO < 3000mm
H=1250mm, SE ALTURA DO VÃO >= 3000mm

IMPORTANTE: (01) Verificar a existência de tubulações ou obstáculos que possam interferir na instalação (área indicada no desenho). (02) É de responsabilidade do cliente providenciar que o local da instalação tenha resistência mecânica adequada a suportar o peso e funcionamento da porta. (03) As superfícies de apoio e piso devem ser planas, rígidas e niveladas. (04) Porta projetada para fluxo de empilhadeiras. (05) Este desenho deve seguir as especificações e opções da proposta Visoflex aceita comercialmente.
Revisão 12 de 24/04/2025

APROVAÇÃO

Nome:_____

Setor:_____

Data:_____

Assinatura:

_____
