VISOFLEX
o futuro começa agora

Desenho de Aprovação Portas Rápidas VFX601 Refrigerada

Especificações

1. Data:
2. Proposta Aprovada:
3. Cliente:
4. Representante :
5. Setor da instalação:
6. QTD:
7. Largura do vão (em mm)
8. Altura do vão (em mm)

9. Lado do motor (indicar quantidade)
- ☐ Direito (como no desenho):
- ☐ Esquerdo:

10. Voltagem
- ☐ 220V/1 fase/60Hz
- ☐ *220V/3 fases/60Hz
- ☐ *380V/3 fases/60Hz
- ☐ *440V/3 fases/60Hz

11. Ferragens (para todas opções colunas em alumínio com pintura eletrostática branca)
- ☐ Pintura eletrostática **Branco** Munsell N9,5
- ☐ Pintura eletrostática **Cinza** Munsell N6,5
- ☐ *Inox 304 (exceto eixo).

12. Quadro de comando
- ☐ Aço Carbono Pintado
- ☐ PSAI (Plástico Industrial)
- ☐ *Aço inox 304 Pintado

13. Cor do PVC
- ☐ Azul
- ☐ Branco
- ☐ Cinza
- ☐ * Outra sob consulta (indicar Obs)

14. Intertravamento
- ☐ Não
- ☐ *Sinal para cortina de ar
- ☐ *Sinal para porta aberta/fechada
- ☐ *Sinal de Intertravamento entre portas Visoflex

15. Tampa de motor
- ☐ Não
- ☐ *Sim

16. Opcionais totais, para todas as portas (indicar QTD ao lado)
- ☐ *Botoeira Extra;
- ☐ *Looping;
- ☐ *Radar;
- ☐ *Pingente (sem braço);
- ☐ *Braço Ping. aço pint.;
- ☐ *Braço Ping. aço inox;
- ☐ *CJ Remoto 433Mhz;
- ☐ *Receptor Digimote;
- ☐ *Transmissor Digimote;
- ☐ *Sonalarme;
- ☐ *Botoeira Touchless;
- ☐ *Barra de LED;
- ☐ *Display Gráf. (tempo);
- ☐ *Resistência de piso.
- ☐ *Resistência de quadro de comando

17. Temperatura Interna
- ☐ -15ºC a -1ºC
- ☐ 0ºC a 15ºC (sem gelo)
- ☐ +16ºC a 50ºC

18. Temperatura Externa
- ☐ -15ºC a -1ºC
- ☐ 0ºC a 15ºC (sem gelo)
- ☐ +16ºC a 50ºC

19. Posição de montagem da porta
- ☐ Interna
- ☐ Externa

20. Pressão do local (direcionada)
- ☐ Sem pressão
- ☐ Antecâmara ou Câmara, baixa: Até 20Km/h

21. Espaços e pontos de fixação necessário verificados no desenho
- ☐ Sim
- ☐ Não

22. Medições realizadas por
- ☐ Visoflex
- ☐ Cliente/Projeto Cliente

23. Observações

*** Itens opcionais (Verificar processo comercial)**

Medidas Necessárias

* Medidas em mm

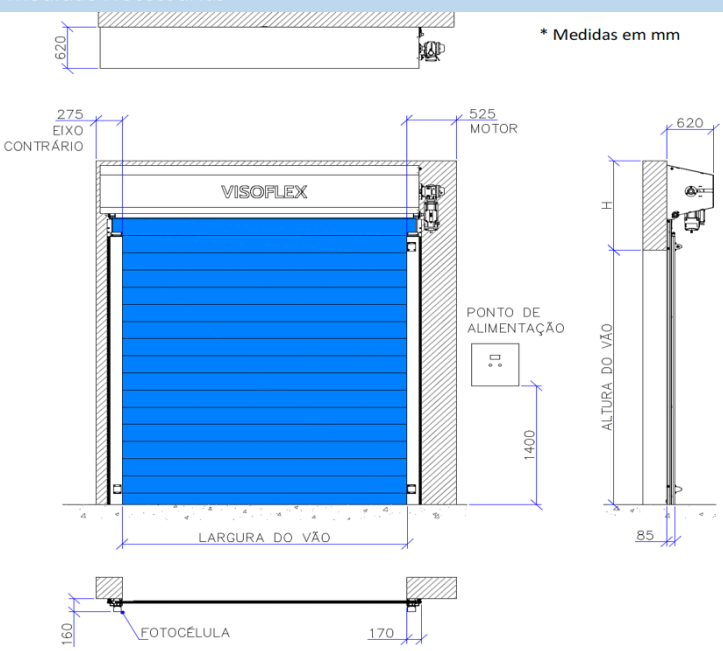

NOTA:
H=1050mm, SE ALTURA DO VÃO < 3000mm
H=1250mm, SE ALTURA DO VÃO >= 3000mm

MPORTANTE: (01) Verificar a existência de tubulações ou bstáculos que possam interferir na instalação (área ndicada no desenho). (02) É de responsabilidade do liente providenciar que o local da instalação tenha esistência mecânica adequada a suportar o peso e uncionamento da porta. (03) As superfícies de apoio e iso devem ser planas, rígidas e niveladas. (04) Porta rojetada para fluxo de empilhadeiras. (05) Este desenho eve seguir as especificações e opções da proposta isoflex aceita comercialmente.
evisão 12 de 24/04/2025

APROVAÇÃO

Nome:_____

Setor:_____

Data:_____

Assinatura:

_____
